



Kvalitetssikring (KS)

Kunnskapsdepartementet oversendte i september 2024 Konseptvalgutredningen til Finansdepartementet, som er ansvarlig for å igangsette ekstern kvalitetssikring (KS).

I desember 2024 mottok UiB tilleggsbestilling knyttet til vurdering av om nybygg-alternativ bør inkluderes i konseptvalgsnotatet. Tilleggsbestillingen skal svares ut innen utløpet av mars. Beslutning om iverksetting av ekstern kvalitetssikring vil forhåpentligvis bli fattet i direkte etterkant av dette.

Kvalitetssikringen vil da kunne starte i april i år, og denne tar vanligvis 4-5 måneder. Underveis i denne prosessen er det forventet at det kommer spørsmål til fagmiljøene om behovene slik de nå er skissert i konseptvalgs-rapporten, og KS-rapporten vil sannsynligvis også gi anbefalinger som må følges opp når OFP-rapporten skal ferdigstilles.


OFP-rapport

KD har gitt UiB muntlig klarsignal til å starte arbeidet med utarbeidelse av Oppstart forprosjekt rapport (OFP), men oppdragsbrevet er ventet å komme etter tilleggsutredningen med nybygg-alternativ. OFP-arbeidet vil foregå parallelt med kvalitetssikringsarbeidet, og målet er at rapporten skal kunne oversendes i tide til at prosjektet kan behandles på regjeringens budsjettkonferanse i august 2025.

Statsbudsjettet 2026

Å sikre tildeling til forprosjekt over statsbudsjettet i 2026 krever at prosjektet settes høyt på den politiske agendaen, både lokalt og nasjonalt. Bidrag til det er en prioritert oppgave på alle nivå i organisasjonen vår, og viktigheten av prosjektet må fremsnakes på de arenaer og i de fora hvor det er mulig. Så langt i år har universitets- og fakultetsledelsen hatt høy aktivitet i sitt arbeid med dette, og instituttene har bidratt med sterke faglige argumenter under de ulike omvisningen på campus.

Veien videre frem mot Forprosjekt-midler

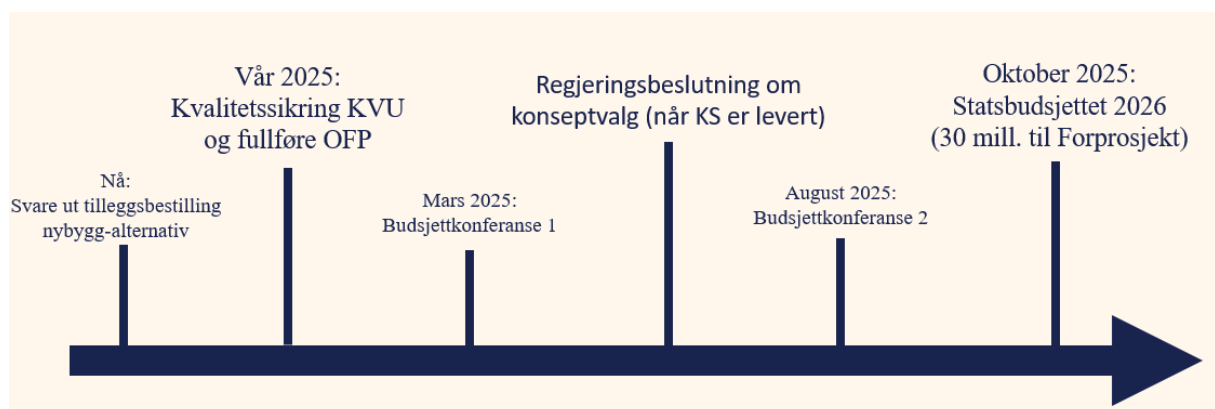

05.02.2025/Kristine Breivik

Gunn Mangerud
dekan
